

مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العويينة

محافظة الاحساء - مدينة الهفوف - حي النعائل

التقرير الفني النصف شهري رقم (5)

عن الفترة من 06/05/2026م
وحتى 05/06/2026 م

المالك:

وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة
والارشاد

المتبرع:

الشيخ / عبداللطيف بن عبدالله الجيمان

إدارة المشروع:

جمعية محاريب للعناية بالمساجد

المكتب المشرف:

مكتب عماد بن محمد الجبر للاستشارات
الهندسية

الشركة المقاول:

شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر
للتجارة والمقاولات



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

الشيخ/ عبداللطيف بن عبدالله الجعيان

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

بالإشارة إلى المشروع أعلاه يسرنا أن نرفع لسعادتكم التقرير الفني النصف شهري رقم (5) لمشروع مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العويينة مقولة شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة والمقاولات، وذلك عن الفترة الزمنية من 2026 /05/06 الى 2026 /06 /05 م.
مرفوع لسعادتكم للإطلاع والإحاطة

والله الموفق



إدارة المشروع / جمعية محاريب للعناية بالمساجد بالاحساء

مدير المشروع : م/ محمد بن مارش المحمدي

الشركة المقولة / شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة والمقاولات

مدير المشروع : م/ طارق بن عبدالله عامر

محتويات التقرير

أولاً: وصف العمل

ثانياً: وصف المشروع

ثالثاً: فريق العمل

رابعاً: الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

خامساً: الاعتمادات

سادساً: نسب الإنجاز والتوصيات

سابعاً: صور فوتوغرافية

ثامناً: صور من المراسلات ومحاضر الاجتماع

تاسعاً: الملاحظات



وصف العمل

- أسم المشروع: مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العوينة.
- موقع المشروع: محافظة الاحساء-مدينة الهفوف – حي النعائل.
- مالك المشروع: وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد.
- اسم المتبرع: عبداللطيف بن عبدالله الجعيमान.
- اسم الاستشاري: مكتب عماد الجبر للاستشارات الهندسية.
- الشركة المقاول: شركة أبناء خالد عبدالقادر للتجارة والمقاولات.
- نوع المشروع: هدم وإعادة بناء.
- مدة المشروع : 10 أشهر.
- طريقة المحاسبة: مستخلصات (نصف شهرية).
- رقم رخصة البناء: 470722268683.
- تاريخ اصدار رخصة البناء: 07/08/1447هـ.
- تاريخ انتهاء رخصة البناء: 07/08/1450هـ.
- تاريخ توقيع العقد: 03/12/2025م.
- تاريخ استلام الموقع: 01/02/2026م.



وصف المشروع

المشروع عبارة عن مسجد تراثي يتكون من التالي:


1. المصلى الرئيسي.

2. ملحق دورات المياه والمواضئ.

3. ملحق غرفة امام.

4- صحن المسجد.

5- مساحات خضراء.

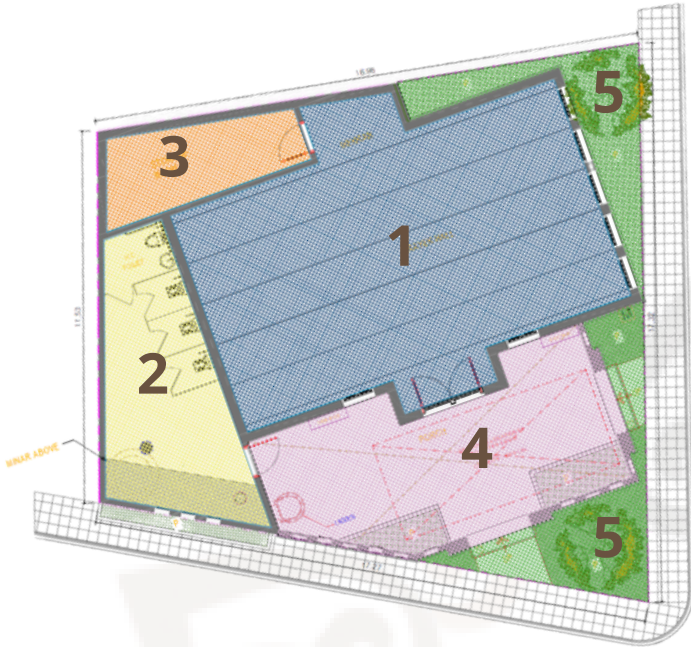[illegible]



البلديات والتخطيط
Ministry of Municipalities and Urban Planning



خدمات
بلدي
balady
SERVICES



رخصة الهدم Demolition License

Owner ID 7000874078	رقم البنية التحتية Building License Date 1447/06/18	Building License NO. 47062174938	رقم رخصة البناء
اسم المالك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدعوة والإرشاد			
Sub-Name المستثمر العام		Building Type حكومي	
Plans NO. بدون		Lot/s Numbers بدون	
Demolition type مبنى عام		Demolition Office مكتب محمد الجبير للاستشارات الهندسية	
Demolition Contractor مقاول الهدم		Demolition Office مكتب محمد الجبير للاستشارات الهندسية	
Ownership Document Date 1447/05/29	Ownership Document NO. 4742970653	Ownership Document عقد استثماري - تخصيص حكومي	
Sub Municipality بلدية الخاليف		Municipality أمانة منطقة الأحساء	
Street شارع رئيسي		District النعائل	
Plot/s 		The location 	



وزارة البلدية والتخطيط
199040



Balady.ks



saoudimomra



balady.gov.sa

رخصة البناء

رخصة الهدم

فريق العمل

إدارة المشروع

جمعية محاريب للعناية بالمساجد في محافظة الاحساء
رقم الترخيص: (5095) - جوال: 0557943555



مكتب عماد الجبر للاستشارات الهندسية
جوال: 0505917243



مكتب عماد الجبر للاستشارات الهندسية
Mad AL-Jabr Engineering Consultants



الشركة المقاوله

شركة أبناء خالد عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة والمقاولات

جوال : 0540303303

شركة أبناء خالد بن عبدالعزيز العبدالقادر للتجارة و المقاولات

تأسست عام 1400هـ وتعمل في مجال التشييد والبناء

مصنفة لدى الهيئة السعودية للمقاولين ومصنفة لدى وزارة

الشؤون البلدية والقروية والإسكان متخصصة في بناء

المساجد و العماائر و المجمعات التجارية



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

فريق العمل

العمالة المستخدمة خلال فترة التقرير



نوع الدوام	العدد	المهنة
مقيم	4	نجار
مقيم	3	حداد
مقيم	4	مليس
مقيم	4	مبلط
مقيم	2	كهربائي
مقيم	2	سباك
مقيم	5	عامل عادي
باطن	7	عمال هليكور

المعدات المستخدمة خلال فترة التقرير

نوع الدوام	العدد	نوع المعدة
مقابل باطن	1	مضخة خرسانة
مقابل باطن	7	عربات خرسانية
مقابل	3	تريلة
مقابل باطن	1	رافعة ميكانيكية



الأعمال المنفذة خلال فترة التقرير

1. اعمال حدادة ونجارة وصب الجسور الخرسانية الحاملة للبلاطات لسقف المصلى وايضاً البلاطة الخرسانية الحاملة للمئذنة.
2. اعمال التأسيسات الالكتروميكانيكية (كهرباء - تغذية - تكييف - دفاع مدني - صوتيات) في المسجد.
3. اعمال لياسة الجدران الداخلية في المسجد والمخزن ودورات المياة والمواضئ وجزء من الجدران الخارجية في الاتجاه الجنوبي والغربي للمسجد.
4. البدء باعمال حدادة ونجارة الجزء الاسفل من المئذنة ثم صبها.
5. اعمال سحب الكابلات والاسلاك الكهربائية.
6. اعمال رخام الارضيات للمصلى في المسجد.
7. اعمال بلاط جدران دورات المياة والمواضئ
8. البدء في اعمال النظام الحامل للاسقف المستعارة في

المصلى



الدفعات المالية و نسب الإنجاز

رقم الدفعة	تاريخ الدفعة	قيمة الدفعة شامل قيمة الضريبة المضافة	نسبة استرداد الدفعة المقدمة	قيمة الدفعة بعد خصم نسبة استرداد الدفعة المقدمة
الدفعة المقدمة %10	22/12/2025	74,785.4 ريال	0%	
المستخلص رقم 1	16/02/2026	41,131 ريال	10%	37,018 ريال
المستخلص رقم 2	04/03/2026	68,845 ريال	10%	61,960 ريال
المستخلص رقم 3	30/03/2026	32,838 ريال	10%	29,554 ريال
المستخلص رقم 4	26/04/2026	39,169 ريال	10%	35,252 ريال
المستخلص رقم 5	03/06/2026	139,849 ريال	10%	125,864 ريال
نسبة الإنجاز حسب كراسة الكميات والمواصفات للمشروع		43.05%		
اجمالي المبلغ المدفوع للشركة المقاوله		364,433.4 ريال		
اجمالي المبلغ المستقطع) الدفعة المقدمة 10%		32,183 ريال		



الفواتير الضريبية للدفعات المقدمة

شركة أبناء خالد عبد العزيز
العبد القادر للتجارة والمقاولات
المسجلة تجريرة السجيرة - الإسكندرية - بورس - شارع مكة -
مبنى رقم 2491
الرقم الضريبي 310976652600003

فاتورة ضريبة / TAX INVOICE

INVOICE NO.: 4
INVOICE DATE: 16/02/2026
INVOICE TYPE: نقدي
CUSTOMER NAME: جمعية محاروب التجارة بالمساجيد
CUST. ADDRESS: 312076576500013
CUST. VAT ID: 312076576500013

رقم الفاتورة :
تاريخ الفاتورة :
نوع الفاتورة :
اسم العميل :
عنوان العميل :
الرقم الضريبي للعميل :

الوصف DESCRIPTION
السعر PRICE
الضريبة 15% TAX 15%
اجمالي السعر TOTAL PRICE

مستخلص رقم 1 مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العويبة	32189.57	4828.43	37018.00
Subtotal الاجمالي قبل الضريبة	32189.57		
Discount قسيمة الخصم	.00		
TAX ضريبة 15%	4828.43		
Total الصافي شامل الضريبة	37018.00		

سجعة وكلائون أكفا وشركة عثر ريال فقط لا غير

NOTE ملاحظات

Scanned with CamScanner

شركة أبناء خالد عبد العزيز
العبد القادر للتجارة والمقاولات
المسجلة تجريرة السجيرة - الإسكندرية - بورس - شارع مكة -
مبنى رقم 2491
الرقم الضريبي 310976652600003

فاتورة ضريبة / TAX INVOICE

INVOICE NO.: 1
INVOICE DATE: 22/12/2025
INVOICE TYPE: نقدي
CUSTOMER NAME: جمعية محاروب التجارة بالمساجيد
CUST. ADDRESS: 312076576500013
CUST. VAT ID: 312076576500013

رقم الفاتورة :
تاريخ الفاتورة :
نوع الفاتورة :
اسم العميل :
عنوان العميل :
الرقم الضريبي للعميل :

الوصف DESCRIPTION
السعر PRICE
الضريبة 15% TAX 15%
اجمالي السعر TOTAL PRICE

مستخلص رقم 1 مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العويبة	65030.78	9754.62	74785.40
Subtotal الاجمالي قبل الضريبة	65030.78		
Discount قسيمة الخصم	.00		
TAX ضريبة 15%	9754.62		
Total الصافي شامل الضريبة	74785.40		

أربعة ومئتين أكفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال وأربعون قطة فقط لا غير

NOTE ملاحظات

Scanned with CamScanner

شركة أبناء خالد عبد العزيز
العبد القادر للتجارة والمقاولات
المسجلة تجريرة السجيرة - الإسكندرية - بورس - شارع مكة -
مبنى رقم 2491
الرقم الضريبي 310976652600003

فاتورة ضريبة / TAX INVOICE

INVOICE NO.: 7
INVOICE DATE: 30/03/2026
INVOICE TYPE: نقدي
CUSTOMER NAME: جمعية محاروب التجارة بالمساجيد
CUST. ADDRESS: 312076576500013
CUST. VAT ID: 312076576500013

رقم الفاتورة :
تاريخ الفاتورة :
نوع الفاتورة :
اسم العميل :
عنوان العميل :
الرقم الضريبي للعميل :

الوصف DESCRIPTION
السعر PRICE
الضريبة 15% TAX 15%
اجمالي السعر TOTAL PRICE

مستخلص رقم 2 مشروع بناء مسجد العويبة	25699.13	3854.87	29554.00
Subtotal الاجمالي قبل الضريبة	25699.13		
Discount قسيمة الخصم	.00		
TAX ضريبة 15%	3854.87		
Total الصافي شامل الضريبة	29554.00		

تسعة وعشرون أكفا وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال فقط لا غير

NOTE ملاحظات

Scanned with CamScanner

شركة أبناء خالد عبد العزيز
العبد القادر للتجارة والمقاولات
المسجلة تجريرة السجيرة - الإسكندرية - بورس - شارع مكة -
مبنى رقم 2491
الرقم الضريبي 310976652600003

فاتورة ضريبة / TAX INVOICE

INVOICE NO.: 5
INVOICE DATE: 04/03/2026
INVOICE TYPE: نقدي
CUSTOMER NAME: جمعية محاروب التجارة بالمساجيد
CUST. ADDRESS: 312076576500013
CUST. VAT ID: 312076576500013

رقم الفاتورة :
تاريخ الفاتورة :
نوع الفاتورة :
اسم العميل :
عنوان العميل :
الرقم الضريبي للعميل :

الوصف DESCRIPTION
السعر PRICE
الضريبة 15% TAX 15%
اجمالي السعر TOTAL PRICE

مستخلص رقم 2 مشروع بناء مسجد العويبة	53878.26	8081.74	61960.00
Subtotal الاجمالي قبل الضريبة	53878.26		
Discount قسيمة الخصم	.00		
TAX ضريبة 15%	8081.74		
Total الصافي شامل الضريبة	61960.00		

واحد وستون أكفا وثمانمائة وستون ريال فقط لا غير

NOTE ملاحظات

Scanned with CamScanner



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

الفواتير الضريبية للدفعات المقدمة



**شركة أبناء خالد عبد العزيز
العبد القادر للتجارة والمقاولات**
الشركة العامة للتجارة - الأمانة - الرياض - شارع مكة -
ج.م.س. رقم 2491
الرقم الضريبي: 310976652600003

TAX INVOICE / فاتورة ضريبة

INVOICE NO.: 8
INVOICE DATE: 26/04/2026
INVOICE TYPE: نقدي
CUSTOMER NAME: جمعية محاربي لخدمة بالمساجد
CUST. ADDRESS: 312076576500013
CUST. VAT ID:

رقم الفاتورة: 8
تاريخ الفاتورة: 26/04/2026
نوع الفاتورة: نقدي
اسم العميل: جمعية محاربي لخدمة بالمساجد
عنوان العميل: 312076576500013
الرقم الضريبي للعميل:



الوصف DESCRIPTION	السعر PRICE	الضريبة 15% TAX 15%	الاجمالي TOTAL PRICE
دفعة مقدمة	30653.91	4598.09	35252.00
مستخلص 4 اشترج بناء مسجد العريفة			
Subtotal الاجمالي قبل الضريبة			30653.91
Discount قيمة الخصم			.00
TAX ضريبة 15%			4598.09
Total الصافي شامل الضريبة			35252.00

خمس و ثلاثون ألفاً ومائتان وأربعون ريال فقط لا غير

ملاحظات:



**شركة أبناء خالد عبد العزيز
العبد القادر للتجارة والمقاولات**
الشركة العامة للتجارة - الأمانة - الرياض - شارع مكة -
ج.م.س. رقم 2491
الرقم الضريبي: 310976652600003

TAX INVOICE / فاتورة ضريبة

INVOICE NO.: 8
INVOICE DATE: 03/06/2026
INVOICE TYPE: نقدي
CUSTOMER NAME: جمعية محاربي لخدمة بالمساجد
CUST. ADDRESS: 312076576500013
CUST. VAT ID:

رقم الفاتورة: 8
تاريخ الفاتورة: 03/06/2026
نوع الفاتورة: نقدي
اسم العميل: جمعية محاربي لخدمة بالمساجد
عنوان العميل: 312076576500013
الرقم الضريبي للعميل:



الوصف DESCRIPTION	السعر PRICE	الضريبة 15% TAX 15%	الاجمالي TOTAL PRICE
دفعة مقدمة	109446.96	16417.94	125864.90
مستخلص الضمان للمشروع 4 اشترج بناء مسجد العريفة			
Subtotal الاجمالي قبل الضريبة			109446.96
Discount قيمة الخصم			.00
TAX ضريبة 15%			16417.94
Total الصافي شامل الضريبة			125864.90

مئة و خمسة و عشرون ألفاً و ثمانمائة و أربعة و تسعون ريال فقط لا غير

ملاحظات:

جمعية محاربي لخدمة بالمساجد - الأمانة			
مشروع بناء مسجد العريفة			
مستخلص رقم (0)			
الوصف	الاجمالي	نسبة الفصل من اجمالي العقد	نسبة الاجاز
1 اشترج الموقع (٢٠٠)	46,164	7.10%	84%
2 اشترج الترسبات (٣٠٠)	198,198	30.49%	87%
3 اشترج الترسبات (٤٠٠)	86,185	13.26%	85%
4 اشترج الترسبات (٥٠٠)	5,750	0.88%	0%
5 الحماية من الحرارة والرطوبة (٧٠٠)	18,620	2.86%	0%
6 اشترج الابواب والنوافذ (٨٠٠)	42,780	6.58%	0%
7 اشترج الترسبات (٩٠٠)	134,891	20.75%	8%
8 ملحقات خاصة (١٠٠٠)	10,250	1.58%	0%
9 اشترج الميكانيكية (١٥٠٠)	55,780	8.58%	15%
10 اشترج الكهربائيات (١٦٠٠)	51,455	7.92%	0%
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة الرقمية			
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ١ غير شامل الضريبة	279,854	43.05%	
ضريبة القيمة المضافة (١٥%) للمستخلص رقم (١)	35,766		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ١ شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%)	3,365		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ١ شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%)	41,131	5.50%	
خصم أول ١٠ % (الدفعة المقدمة)	4,113		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الأول شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%) بعد خصم نسبة الدفعة المقدمة	37,018		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٢ غير شامل الضريبة	59,865	9.21%	
ضريبة القيمة المضافة (١٥%) للمستخلص رقم (٢)	8,980		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٢ شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%)	68,845		
خصم ثاني ١٠ % (الدفعة المقدمة)	6,884		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الثاني شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%) بعد خصم نسبة الدفعة المقدمة	61,960		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٣ غير شامل الضريبة	28,555	4.39%	
ضريبة القيمة المضافة (١٥%) للمستخلص رقم (٣)	4,283		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٣ شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%)	32,838		
خصم ثالث ١٠ % (الدفعة المقدمة)	3,284		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الثالث شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%) بعد خصم نسبة الدفعة المقدمة	29,554		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٤ غير شامل الضريبة	34,060	5.24%	
ضريبة القيمة المضافة (١٥%) للمستخلص رقم (٤)	5,109		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٤ شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%)	39,169		
خصم رابع ١٠ % (الدفعة المقدمة)	3,917		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الرابع شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%) بعد خصم نسبة الدفعة المقدمة	35,252		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٥ غير شامل الضريبة	121,608	18.71%	
ضريبة القيمة المضافة (١٥%) للمستخلص رقم (٥)	18,241		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص رقم ٥ شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%)	139,849		
خصم رابع ١٠ % (الدفعة المقدمة)	13,985		
اجمالي قيمة الدفعة المستحقة في المستخلص الخامس شامل ضريبة القيمة المضافة (١٥%) بعد خصم نسبة الدفعة المقدمة	125,864		



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

لوحة المشروع



صور فوتوغرافية

- اعمال حدادة ونجارة وصب الجسور الخرسانية الحاملة للبلاطات لسقف المصلى وايضاً البلاطة الخرسانية الحاملة للمئذنة.



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

- اعمال التأسيسات الالكتروميكانيكية (كهرباء - تغذية - تكييف - دفاع مدني - صوتيات) في المسجد.




0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

- اعمال التأسيسات الالكتروميكانيكية (كهرباء - تغذية - تكييف - دفاع مدني - صوتيات) في المسجد.

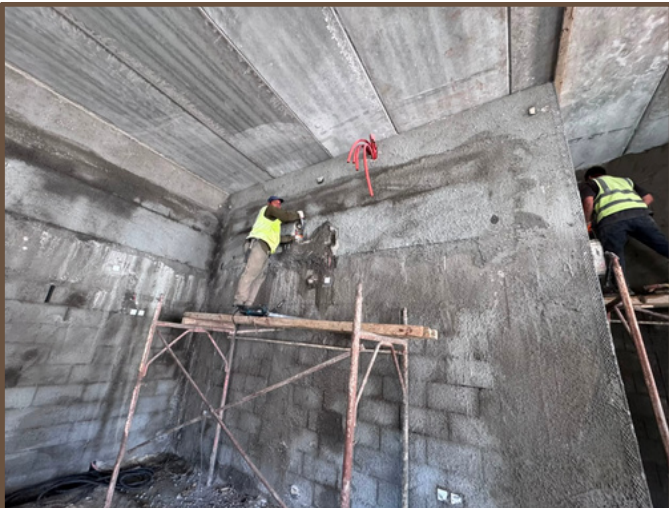


0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

- اعمال لياسة الجدران الداخلية في المسجد والمخزن ودورات المياه والمواضع وجزء من الجدران الخارجية في الاتجاه الجنوبي والغربي للمسجد.

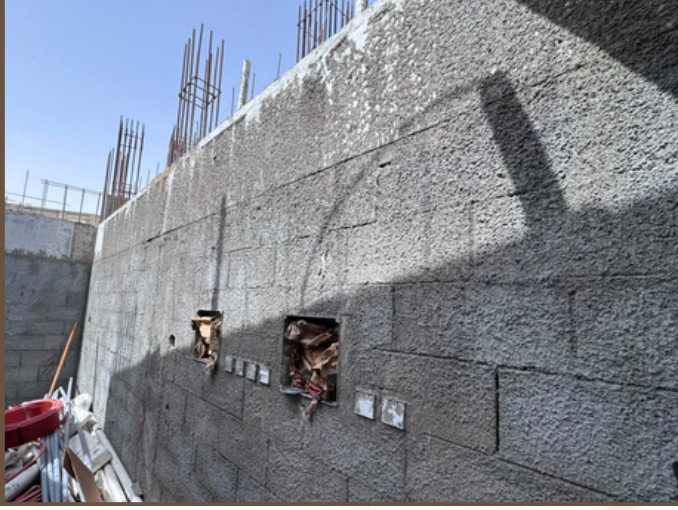


0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

- البدء باعمال حدة ونجارة الجزء الاسفل من المئذنة ثم صبها.

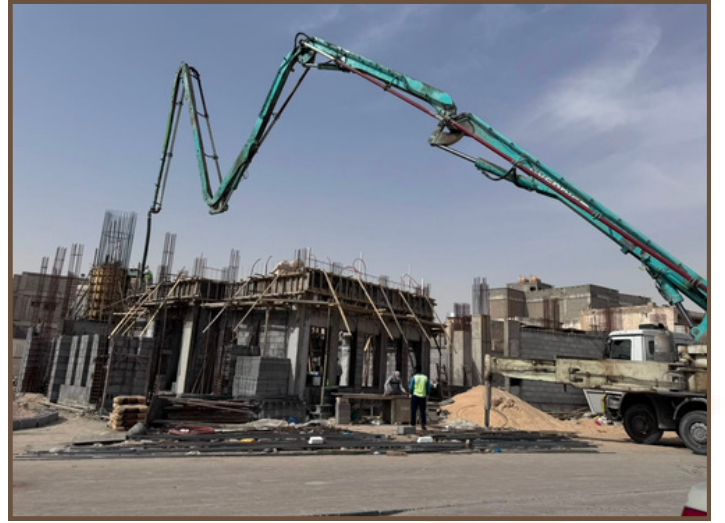



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• اعمال سحب الكابلات والاسلاك الكهربائية.

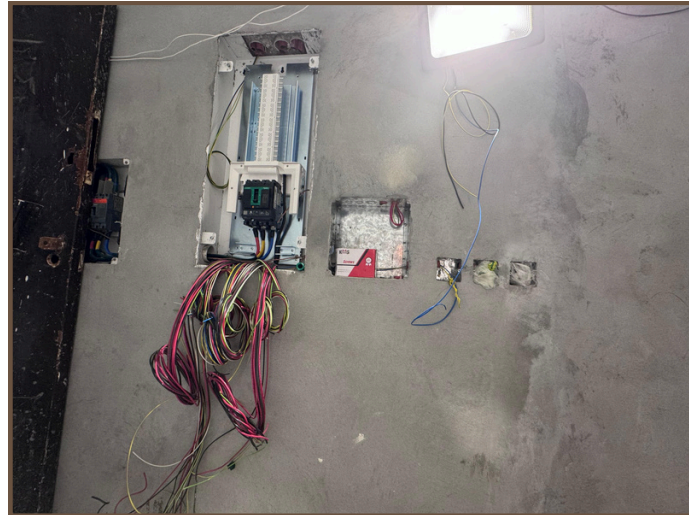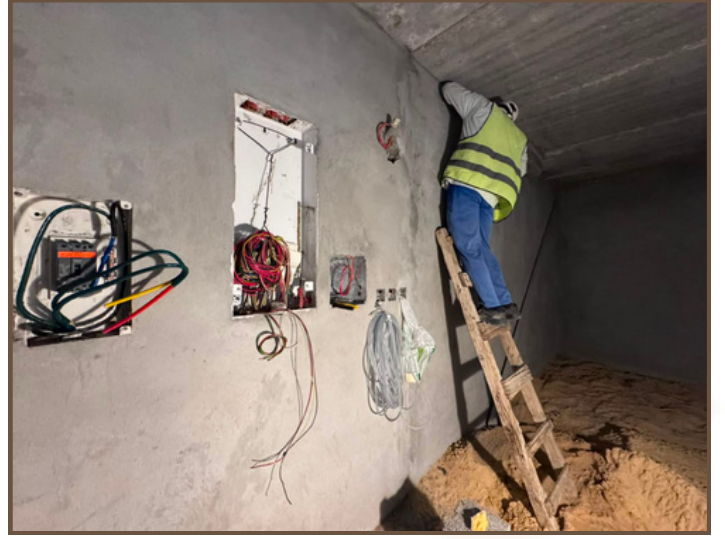

0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• اعمال رخام الارضيات للمصلن في المسجد.



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

• اعمال بلاط جدران دورات المياه والمواضئ



0558174555- 0557943555



maharib.org@gmail.com

صور فوتوغرافية

- البدء في اعمال النظام الحامل للاسقف المستعارة في المصلى



الاعتمادات

- اعتماد شبك الفيبر لاعمال اللياسة من شركة (PALADIN)

Request to approve materials - طلب اعتماد مواد

اسم المشروع : هدم وإعادة بناء مسجد العوينة
Project Name: _____

نوع العينة : اعتماد شبك فيبر اللياسة
Sample Type: _____

الجهة الموردة : شركة PALADIN الماني
Sample Supplier: _____

رقم الطلب : _____
Submittal No: _____

نوع العمل Type of Work	ميكانيكا Mech	كهرباء Elect	تشطيبات Finishing	مدني / انشائي Civil
Required Inspection Time: زمن طلب الاستلام:			التاريخ: 12/5/2026 Date:	

Description of Work - وصف العمل:
شبكة لزوم ليااسة الداخلية والخارجية (شبكة فيبر هلاس)

اسم مقدم الطلب و التوقيع
Signed by: م. طارق عامر

Response			
☐ Approved	☐ Approved as	☐ Rejected	☐ Other Specify _____

Remarks - ملاحظات:
لإعادة من استلام الشبك الفيبر مادة Paladin وثمارها
طبق اعتماد المصير المرفق

اسم معتمد الطلب و التوقيع
Signed by: أ. محمد سري



الاعتمادات

- اعتماد مواسير (خضراء حراري) من شركة (تحويل)

Request to approve materials - طلب اعتماد مواد

اسم المشروع : هدم وإعادة بناء مسجد العويبة
Project Name: _____

نوع العينة : مواسير التغذية (خضراء حراري) تحويل
Sample Type: _____

الجهة الموردة : شركة تحويل
Sample Supplier: _____

رقم الطلب : _____
Submittal No : _____

نوع العمل Type of Work	ميكانيكا Mech	كهرباء Elect	تشطيبات Finishing	مدني / انشائي Civil
Required Inspection Time: زمن طلب الاستلام	☒	☐	☐	☐

التاريخ : 12/5/2026
Date: _____

وصف العمل - Description of Work
اتحاد مواد لزوم مواسير تغذية ودرجات المساحة والواضحة وان توصيلها بمتابعتها الموصلة (مواسير خضراء حراري) شركة تحويل بجميع اقطارها

اسم مقدم الطلب و التوقيع
Signed by: م. الحارث عمار

Response			
☒ Approved	☐ Approved as	☐ Rejected	☐ Other Specify

ملاحظات - Remarks
لا مانع من استخدام مادة تحويل في المواسير الحرارية وجميع اكسسواراتها

اسم معتمد الطلب و التوقيع
Signed by: أ. محمد مارت 12/5/2026



الاعتمادات

- اعتماد اللوحات و القواطع الكهربائية من شركة (شنايدر)

طلب اعتماد مواد - Request to approve materials

اسم المشروع: مشروع هدم وإعادة بناء مسجد العوينة
Project Name:

نوع العينة: جبلون وقواطع كهرباء
Sample Type:

الجهة الوردية: مشيد
Sample Supplier:

رقم الطلب:
Submittal No:

نوع العمل Type of Work	ميكانيكا Mech	كهرباء Elect	تشطيبات Finishing	مدني / انشائي Civil
Required Inspection Time: زمن طلب الاستلام			التاريخ Date: 12/5/2026	

وصف العمل - Description of Work:

اعتماد عينة جبلون 80 أمبير 36 خط نوع مشيد
واعتماد قاطع رئيسي 80 أمبير 3 فاز حساس نوع مشيد

اسم مقدم الطلب و التوقيع
Signed by: محمد الطاهر عمار

Response			
☐ Approved	☒ Approved as	☐ Rejected	☐ Other Specify

ملاحظات - Remarks:

تم تعديل اللوحات الكهربائية عن المشروع حيث سيتم الاستعاضة عن اللوحة الرئيسية
بمقاطع مساوية 80 أمبير (شنايدر) مع صندوق 36 واللوح الفرعية مع الاستعاضة عنها
بلمبة ذات قاطع 80 أمبير (شنايدر) نوع 36 Mxf خط .

اسم معتمد الطلب و التوقيع
Signed by: محمد الطاهر عمار





وفقنا الله واياكم
لخدمة بيوت الله



<https://maharib.org.sa/>

